

덕포동 노후옹벽 디자인 개선사업(사상구)

□ 사업목적

- 각종 개발사업의 추진으로 발생된 옹벽 등 콘크리트 소재의 도시 구조물로 인한 삭막한 도시경관과 불량한 보행환경 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 2021. 6월
- 사업위치 : 사상구 덕포동 760 일원(모덕로 골다리 옹벽)
- 사업비 : 시비 180백만원(일반회계)
 - 산출근거 : 전체면적(대략 850m²)×40%(디자인면적)×500천원/m²
 *m²당 단가(오브제설치) : 약 500천원 (단, 옹벽 바탕만들기 공정 제외)
- 사업내용 : 디자인 조형물 및 경관조명 설치(L=422m, H=1~6m)
(옹벽 도장 1,293m², 원형포인트 조형물 7개소, 채널 설치 6개소 등)
- 기대효과 : 옹벽 개선을 통한 도시 미관 및 보행 환경 개선

□ 예산/집행현황

(단위 : 천원)

예산과목	집행현황					
	예산현액	지출액	집행률	계획수립	착수 현황	추진유형
자치단체자본보조 (403-01)	180,000	175,579	97.5%	○	○	구군 보조사업
특이사항						

□ 추진경과 및 향후계획

- '20. 2. : 보조금 교부(2.20)
- '20. 5. : 실시설계 착수(5.18)
- '20. 6. : 주민설명회 개최(6.10)
- '20.11. : 실시설계 준공(11.5)
- '21. 1. : 공사 착공(1.15)
- '21. 5. : 공사 준공(5.27.)
- '21. 7. : 추가 정비 완료(7.30.)


건축주택국	도시디자인과	담당자 : 박성일 ☎888-4341
사상구	도시재생과	담당자 : 김은경 ☎310-4622

□ 사업명 : 덕포동 노후옹벽 디자인 개선사업

사 업 위 치 도



현 황 사 진

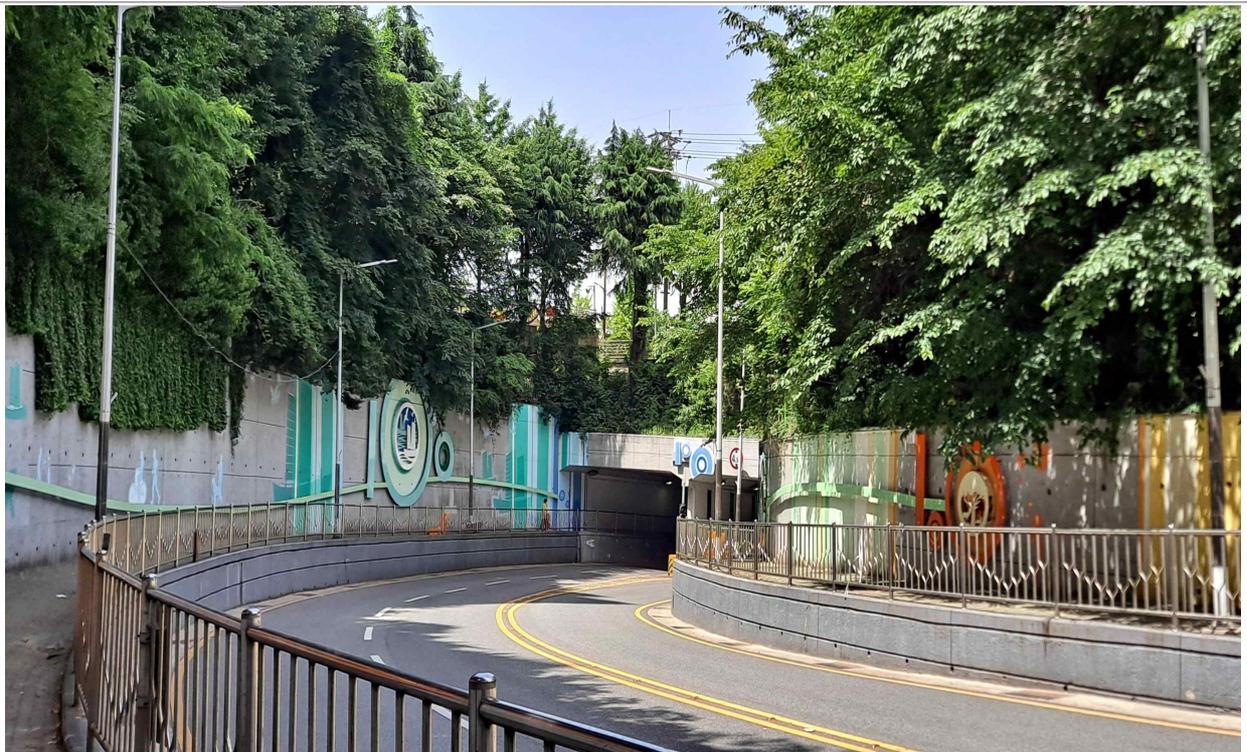

현 황 사 진



현 황 사 진

